







# GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

# OBRAS DE CONTINUIDAD



	PROYECTO	MODALIDAD	ESTADO SITUACIONAL A RECEPCION DE GESTION	ESTADO ACTUAL GESTION - 2011	OBSERVACIONES
1	 "AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL JR. SUCRE TRAMO: JR. SAN CRISTOBAL – JR. BOLOGNESI I ETAPA"	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	65 % CONCLUIDO – HUBO DEDUCTIVOS AL 35 %	TRAMITE ADMINISTRATIVO, <b>RECEPCION DE OBRA</b>	- <b>CONCLUIDO</b>
2	 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE SAN PEDRO – SURCUBAMBA"	CONVENIO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA	95 % AVANCE FISICO	TRAMITE ADMINISTRATIVO, <b>RECEPCION DE OBRA – 100 %</b>	- <b>CONCLUIDO</b>
3	 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JORGE CHÁVEZ SACHA COTO (LOSA DEPORTIVA/PATIO DE FORMACIÓN CERCO PERIMÉTRICO)	ADMINISTRACION DIRECTA	95 % AVANCE FISICO	TRAMITE ADMINISTRATIVO, <b>PARA RECEPCION DE OBRA – 100 %</b>	- <b>CONCLUIDO</b>
4	 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DISTRITO DE PAMPAS- PROV. TAYACAJA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA" PRIMERA ETAPA	CONTRATA	2.5 % AVANCE FISICO	39.37 % AVANCE FISICO – <b>EN EJECUCION</b>	- <b>EN EJECUCION</b>
5	 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ANEXO DE YURAQASA-DISTRITO DE ACRAQUIA	CONTRATA	98.50 % AVANCE FISICO	TRAMITE PARA <b>RECEPCION DE OBRA – 100 %</b>	- <b>CONCLUIDO</b>
6	 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SUNTUR - TUCUMA-LA COLPA DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS	CONTRATA	95 % AVANCE FISICO	TRAMITE PARA <b>RECEPCION DE OBRA x TRAMOS</b>	- <b>CONCLUIDO</b>
7	 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MOSQUETA PAMPA-PAMPAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	95 % AVANCE FISICO	PARALIZADO	- <b>INTERVENIDO</b>
8	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL INICIAL N° 297- HUCHUYSIHUIS - DISTRITO DE TINTAYPUNCU - TAYACAJA	CONVENIO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAYPUNCU	75 % AVANCE FISICO	TRAMITE PARA <b>RECEPCION DE OBRA – 100 %</b>	- <b>CONCLUIDO</b>

**Obra:**

**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO, DISTRITO DE PAMPAS ,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA – I ETAPA**



<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/.</b> <b>4'056,145.58</b>
<b>Modalidad de ejecución</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>270 Días</b>
<b>Inicio de obra</b>	<b>10 de Junio</b>
<b>Empresa</b>	<b>CONSORCIO P &amp; M</b>
<b>Supervisor</b>	<b>CONSORCIO D &amp; B</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>	<b>Valorización 04</b>
<b>79.69 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PAMPAS – TAYACAJA – HUANCAMELICA**



<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/.</b> <b>254,798.31</b>
<b>Modalidad de ejecución</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>90 Días</b>
<b>Inicio de obra</b>	<b>10 de Junio</b>
<b>Empresa</b>	<b>CITECC S.A.C.</b>
<b>Supervisor</b>	<b>Ing. Héctor ARANA YARANGA</b>

Avance Físico	Valorización 01	Valorización 02	Valorización 03	Valorización 04
<b>100 %</b>	<b>41.50 %</b>	<b>14.59 %</b>	<b>29.26%</b>	<b>14.65%</b>

**Obra:****MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. COLON: TRAMO JR. SAN CRISTÓBAL – JR. MOORE , DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/. 750,268.89</b>
<b>Modalidad</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>120 Días</b>
<b>Inicio de obra</b>	<b>10 de Junio</b>
<b>Empresa</b>	<b>CITECC S.A.C.</b>
<b>Supervisor</b>	<b>Ing. Fredy León Villar</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100 %</b>	<b>45.30 %</b>	<b>13.54 %</b>	<b>7.51%</b>

**Obra:**

**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA TINTAY DISTRITO DE TINTAY-PUNCU- TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/.</b> <b>545,781.40</b>
<b>Modalidad</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>90 días</b>
<b>Inicio de obra</b>	<b>10 de Junio</b>
<b>Empresa</b>	<b>CITECC S.A.C.</b>
<b>Supervisor</b>	<b>Empresa: ONAZCA Consult. Y Contr. S.R.L.</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>72.80 %</b>	<b>54.24 %</b>	<b>18.56 %</b>	<b>%</b>

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL EN LÁCTEOS-DISTRITO DE ACRAQUIA - TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/. 167,589.90</b>		
<b>Modalidad</b>	<b>CONTRATA</b>		
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>90 Días</b>		
<b>Inicio de obra</b>	<b>2 de Junio</b>		
<b>Empresa</b>	<b>GROUP-KAM CONSULTORES CONTRATISTAS S.A.C.</b>		
<b>Supervisor</b>	<b>Ing. Pedro Paucar Camposano</b>		
<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>64.05 %</b>	<b>20.99 %</b>	<b>14.96 %</b>

**MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL AV. TAYACAJA - TRAMO JR. TACNA - JR.  
Obra: LEANDRO OSPINA Y PERÍMETROS DE LAS PLAZAS ANTIGUAS Y NUEVA EN EL C.P.  
SANTIAGO DE TUCUMA - PAMPAS**



<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/. 826,239.53</b>
<b>Modalidad</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>90 Días</b>
<b>Inicio de obra</b>	<b>15 de Agosto</b>
<b>Empresa</b>	<b>AD &amp; J INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.</b>
<b>Supervisor</b>	<b>Ing. Fredy León Villar - Ing. Vladimir Arce</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>29.18 %</b>	<b>40.14 %</b>	<b>25.68 %</b>	<b>04.99%</b>

**Obra:** MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N° 31397 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA



<b>Costo de Ejecución de Obra</b>	<b>S/.</b> <b>183,919.34</b>
<b>Modalidad</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>90 Días</b>
<b>Inicio de obra</b>	<b>24 de Agosto</b>
<b>Empresa</b>	<b>GROUP-KAM CONSULTORES CONTRATISTAS S.A.C.</b>
<b>Supervisor</b>	<b>Arq. Oliver Yañac Pillco</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>98.10 %</b>	<b>45.73 %</b>	<b>35.51 %</b>	<b>%</b>

**Obra:** AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA



Costo de Ejecución de Obra	<b>S/.</b> <b>144,351.22</b>		
Modalidad	<b>CONVENIO</b>		
Plazo de Ejecución	<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO</b>		
Inicio de obra			
Empresa			
Supervisor			
<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>80 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Proyecto: ACONDICIONAMIENTO CON INSTRUMENTOS MUSICALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LOS 16 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA**



Costo de Ejecución de Obra:	<b>S/.</b> <b>416,330.00</b>
Modalidad:	<b>ADMIN. DIRECTA</b>
Plazo de Ejecución:	
PROYECTO:	<b>CULMINADO</b>
Empresa:	
Supervisor:	

Avance Físico	Valorización 01	Valorización 02	Valorización 03
<b>100 %</b>	%	%	%

## OBRA EN EJECUCION:

### MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA

FUTURO MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE PAMPAS



Costo de Ejecución de Obra:	<b>S/.</b> <b>2'683,555.06</b>
Modalidad:	<b>CONTRATA</b>
Plazo de Ejecución:	<b>240 Días</b>
Inicio de obra:	<b>04 de Nov.</b>
Empresa:	<b>CONSORCIO SAN PEDRO DE PAMPAS</b>
Supervisor:	<b>ING. CLAYER MORALES DIAZ</b>

Avance Físico	Valorización 01	Valorización 02	Valorización 03
<b>20.41 %</b>	<b>20.41 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA MATRIZ SAN PEDRO DE PAMPAS DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 405,223.76</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>90 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>16 de Setiembre</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L.</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>Arq. Albaro G. Morales Díaz</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>70.58 %</b>	<b>25.42 %</b>	<b>45.16 %</b>	<b>%</b>

**Obra:** MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN DIEZ COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PAMPAS



Costo de Ejecución de Obra:	S/. <b>4'203,255.98</b>
Modalidad:	<b>CONTRATA</b>
Plazo de Ejecución:	<b>360 Días</b>
Inicio de obra:	<b>20 de Octubre</b>
Empresa:	<b>CONSORCIO SCORPION</b>
Supervisor:	<b>ING. CLAYER MORALES DIAZ (CONSORCIO SANTA EULALIA)</b>

Avance Físico	Valorización 01	Valorización 02	Valorización 03
<b>55.74 %</b>	<b>27.51 %</b>	<b>28.02 %</b>	<b>%</b>

## OBRA EN EJECUCION:

### CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA TEMPERADA Y CENTRO DE RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA – PRIMERA ETAPA



Costo de Ejecución de Obra:	S/. <b>895,000.00</b>
Modalidad:	<b>ADMIN. DIRECTA</b>
Plazo de Ejecución:	<b>180 Días</b>
Inicio de obra:	<b>15 DE NOV.</b>
Empresa:	
Supervisor:	

#### FUTURA PISCINA TEMPERADA BARRIO CHALAMPAMPA

Avance Físico	Valorización 01	Valorización 02	Valorización 03
<b>0.00 %</b>	%	%	%

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN DE AYACCOCHA - TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 300,872.77</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONVENIO</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>90 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>23 DE NOV.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>HG&amp;P S.R.L</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ING. FELIX CHALCO MEDINA</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>10.00 %</b>	<b>10.00%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 529,596.56</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>10 de Nov.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSORCIO TOCAS</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. CESAR PAUL TRILLO</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>40.34 %</b>	<b>40.34 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:****MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES", DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/.</b> <b>49,957.00</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>20 DE Set.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSTRUCTING INTERNATIONAL</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>78.86 %</b>	<b>21.14 %</b>	<b>%</b>

**Obra:****AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL BARRIO DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 626,649.51</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>90 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>29 de Oct.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L.</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ING. FÉLIX CHALCO MEDINA</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>50.26 %</b>	<b>50.26 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO FERIAL DEL CENTRO POBLADO DE PICHUS, DISTRITO DE HUARIBAMABA - TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/.</b> <b>548,742.47</b>		
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>		
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>180 Días</b>		
<b>Inicio de obra:</b>	<b>18 Noviembre</b>		
<b>Empresa:</b>	<b>GROUP - KAM CONSULTORES CONTRATISTAS S.A.C.</b>		
<b>Supervisor:</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO MPT</b>		
<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>26.58 %</b>	<b>26.58%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE UCHUY SIHUIS, DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 583,170.90</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>120 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>10 DE DIC.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSORCIO SAN FERNANDO</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>05.00 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 101,570.97</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>08 de Set.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSTRUCTING CONSULTING S.R.L.</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>69.38 %</b>	<b>30.62 %</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE QUIMLLO, DISTRITO DE SAN MARCO DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 99,999.00</b>		
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>		
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 DIAS</b>		
<b>Inicio de obra:</b>	<b>15 De Octubre</b>		
<b>Empresa:</b>	<b>CONSTRUCTORA CALIPSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>		
<b>Supervisor:</b>	<b>JOSE MANUEL SOTO RODRIGUEZ</b>		
<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>47.00 %</b>	<b>47.00 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANANYAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 110,028.00</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 DIAS</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>28 DE SET.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>KUMIT' CONTRATISTA &amp;CONSULTORES SRL</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ING. JOSE LUIS RAMOS VILA</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>66.15%</b>	<b>33.85%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO DE SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 106,077.00</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>12 de Octubre</b>
<b>Empresa:</b>	<b>KUMIT' CONTRATISTA &amp;CONSULTORES SRL</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ING. JOSE LUIS RAMOS VILA</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>60.00 %</b>	<b>60.00 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:**

**CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO DE HUACCHUAS DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA**



<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 97,872.00</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 DIAS</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>17 DE OCTUBRE</b>
<b>Empresa:</b>	<b>SIRIUS INGENIERIA Y CNSTRUCCIÓN S.A.C</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ING. JOSE MANUEL SOTO RODRIGUEZ</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>96.08 %</b>	<b>96.08 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLACUCHO,  
DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 108,720.44</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 DIAS</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>15 DE OCTUBRE</b>
<b>Empresa:</b>	<b>EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA GUTIERREZ</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. ELIZABETH EULOGIO MATOS</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>98.00 %</b>	<b>35.12 %</b>	<b>62.88 %</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA I.E. N° 30949 DE LA LOCALIDAD HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 98,535.85</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 DIAS</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>15 DE OCTUBRE</b>
<b>Empresa:</b>	<b>EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA GUTIERREZ</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ELIZABETH EULOGIO MATOS</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>58.87 %</b>	<b>41.13 %</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE HUACCAYRUMI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 95,931.14</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>2 MESES</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>11 de Nov.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>EMPRESA HC MERCURIO EXPOR CONTRATISTAS S.A.C</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>34.27 %</b>	<b>34.27 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SOCORRO, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 96,444.42</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>13 de Oct.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>EMPRESA EJECUTORA CONSORCIO DANIELITA</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. OLIVER YAÑAC PILLCO</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>88.44 %</b>	<b>11.56 %</b>	<b>%</b>

**Obra:****CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DE CEDROPAMPA-DISTRITO DE SALCABAMBA,  
PROVINCIA DE TAYACAJA**

<b>Costo de Ejecución de Obra:</b>	<b>S/. 101,018.99</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>CONTRATA</b>
<b>Plazo de Ejecución:</b>	<b>45 Días</b>
<b>Inicio de obra:</b>	<b>01 de Nov.</b>
<b>Empresa:</b>	<b>CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L.</b>
<b>Supervisor:</b>	<b>ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS</b>

<b>Avance Físico</b>	<b>Valorización 01</b>	<b>Valorización 02</b>	<b>Valorización 03</b>
<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>%</b>	<b>%</b>

**PERFILES Y  
% POR CADA FUNCION PROGRAMATICA**

<b>FUNCIÓN PROGRAMÁTICA</b>	<b>CANTIDAD PEFILES</b>	<b>%</b>
EDUCACION	6	24%
TRANSPORTE-SANEAMIENTO	9	36%
SALUD-MEDIO AMBIENTE	2	8%
CULTURA Y DEPORTE	2	8%
ENERGIA-AGROPECUARIA	3	12%
COMUNICACIÓN	1	4%
PROTECCION SOCIAL- PLANEAMIENTO , GESTION	2	8%
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

PERFILES PRESENTADOS, OBSERVADOS Y VIABLES  
(DE ENERO – 2011 A DICIEMBRE - 2011)

<b>ESTADO</b>	<b>PERFIL</b>	<b>PRE- FACTIBILI DAD</b>	<b>FACTIBI LIDAD</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>%</b>
Formulación	3	0	0	3	12%
Observados	2	0	0	2	12%
Perfiles Viables	21	0	0	20	76%
<b>TOTAL</b>				<b>25</b>	<b>100%</b>

**- TOTAL PERFILES VIABLES ACUMULADOS DESDE EL AÑO 2011 A LA FECHA (DICIEMBRE-2011) ES LA CANTIDAD DE 25 PERFILES.**

## EXPEDIENTES APROBADOS EN EL AÑO 2011:

EXPEDIENTES TECNICOS	CANTIDAD EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS
EDUCACION	12
PAVIMENTACION-SANEAMIENTO	09
SALUD-MEDIO AMBIENTE	02
CULTURA Y DEPORTE	13
ENERGIA-AGROPECUARIA	03
OTROS (Campo Ferial, Gestión Comunitaria, mercado, Centro Beneficiario , Lácteos y Planta de Tratamiento)	06
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

***SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS.***

ITEM	OBRA	AÑO EJECUCION	OBSERVACION	ESTADO ACTUAL
1	Construccion y equipamiento del Puesto de Salud de la Comunidad de Socorro-Pampas Tayacaja Huancavelica.	2009	CON LIQUIDACION TECNICA	SIN LIQUIDACION FINANCIERA
2	Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable Instalaciones en el Anexo de Chauchora Pampas Tayacaja Huancavelica.	2010	CON LIQUIDACION TECNICA	SIN LIQUIDACION FINANCIERA
3	Acabado de tres Aulas de la Institucion Educativa Mariscal Caceres de Tucuma.	2006	CON LIQUIDACION TECNICA	SIN LIQUIDACION FINANCIERA
4	Insitacion de una Area Forestal en Pampas .	2011	CON LIQUIDACION TECNICA	SIN LIQUIDACION FINANCIERA
5	Construccion de Agua e Instalacion de Letrinas de Seccepire.	2009	CON LIQUIDACION TECNICA	SIN LIQUIDACION FINANCIERA

**ELABORADO POR COLSULTORIA EXTERNA**

ITEM	OBRA	AÑO EJEC	MODALIDAD	OBSERVACION	ESTADO ACTUAL
1	Obra Pavimentacion Mariscal Caceres II Etapa.	2008	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
2	Obra Pavimentacion y Saneamiento Mariscal Caceres I Etapa.	2006	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
3	Construccion Casa del Adulto Mayor.	2010	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
4	Obra Ampliacion Red Alcantarillado Jr Horacio Zevallos.	2009	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
5	Obra A.v Peru Daniel Hernandez.	2008	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
6	Mejoramiento y Ampliacion del Jr. Cordova I Etapa.	2008	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
7	Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana Mediante la Implementacion de la Comisaria de la Localidad de Pmapas provincia de Tayacaja.	2009-2010	CONTRATA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
8	Mejoramiento Vial de Calles y Veredas	2009	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
9	Obra Mejoramiento y Ampliacion J.R San Martin I etapa.	2008	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
10	Mejoramiento y Ampliacion Jr. San Martin.-Jr San Cristobal. II Etapa	2008	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.
11	Mejoramiento de la Actividad Turistica del Distrito de Pampas	2009	ADM DIRECTA	Sin Liquidacion Tecnico Financiera, con Observaciones Fisico y Documentario.	ELABORADO POR CONSULTORIA EXTERNA.

**PARA LIQUIDACION FINAL DE OBRA**


ITEM	OBRA	AÑO EJEC	OBSERVACION	ESTADO ACTUAL
1	Construcción de Losa Multidertiva Jose Galvez Egusquiza, Puerto San Antonio, Distrito Tintay Puncu-Tayacaja Huancavelica.	2008	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	EN ALCALDIA PARA LA APROBACION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
2	Construcción de Losa Multideportiva Anexo Pocyac Distrito Colcabamba, Provincia de Tayacaja.	2010	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	EN ALCALDIA PARA LA APROBACION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
3	Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Institucion Educativa N  31025 de Totorá del Distrito de Ahuaycha-Tayacaja Huancavelica.	2008	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
4	Construcción de la I.E. Mollepata- Salcabamaba.	2009	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
5	Construcción de Puente Vehicular Yarcacancha Distrito de Ahuaycha Provincia de Tayacaja-Huancavelica.	2011	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
6	Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa Manuel Scorza Mullaca Pazos Tayacaja	2010	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
7	Mejoramiento de Sistema de Riego de Loma Baja Salcahuasi.	2008	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
8	Construcción de la Infraestructura Básica de la Institución Educativa Inicial N° 639 de San Cristobal-Colcabamaba-Tayacaja-hvca.	2011	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
9	Construcción e Implementación del Centro Educativo Basico Especial 35002-Pampas-Tayacaja-HVCA.	2008	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
10	Mejoramiento y Ampliación de la Red Desague Pluvial.	2007	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ASESORIA LEGAL PARA EVALUACION DE ANTEPROYECTO
11	Mejoramiento Vial jr. Necochea-I Etapa	2009	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
12	Construcción de la Alameda del Jr. Grau.	2006	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
13	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado integral de la Localidad Acostambo.	2005	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
14	Sustitución de Aulas y Ampliación de la Infraestructura del Complejo Educativo Yacuraquina de Pampas-Tayacaja.	2006	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
15	Construcción de Sistema de Riego Curibamba-Salcahuasi.	2008	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
16	Construcción de Losa Multideportiva del Anexo de Tongos - Pazos.	2006	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
17	Construcción Aulas de la I.E. San Jose Tintay Puncu.	2007	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
18	Construcción de Canal de Irrigacion del Centro Poblado Ayacancha.	2009	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
19	Mejoramiento de la infraestructura de Riego Yuraccasa-Acraquia-Tayacaja.	2010	CON LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
<b>OBRAS POR CONVENIO</b>				
21	Institución Educativa Yacuraquina por Convenio con Sub Región Huancavelica	2009	LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARA LA LIQUIDACION	No se cuenta con liquidación ecnico financiero debido a q la unidad ejecutora no nos remite el documento.
22	Construcción de Cerco Perimétrico en Ñahuinpuquio por Convenio. Con la Municipalidad Distrital de Ñahuinpuquio.	2009	LA UNIDAD EJECUTORA REALIZO LA LIQUIDACION	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
23	Construcción de Canal de Irrigación de Tintay Punto por Convenio con la Municipalidad Distrital de Tintay Punco	2010	LA UNIDAD EJECUTORA REALIZO LA LIQUIDACION	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
24	Construcción de Losa de Lausa Chico Acostambo por Convenio con la Municipalidad Distrital de Acostambo.	2010	LA UNIDAD EJECUTORA REALIZO LA LIQUIDACION	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE REAOLUCION DE LIQUIDACION FINAL
25	Construcción de Losa de Barrio Unión Acostambo por Convenio con la Municipalidad	2009	LA UNIDAD EJECUTORA REALIZO LA LIQUIDACION	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE

## PLANIFICANDO EN LA CIUDAD URBANA Y RURAL

### PLAN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO DE PAMPAS

- Se cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano Vigente hasta el 19 de febrero de 2013

- Aprobación según la ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2008-MPT/A, el 19 de Febrero del 2008.
- Actualmente se cuenta con los siguientes instrumentos:
  - Diagnostico Urbano
  - Propuesta urbana
  - Proyectos de Inversión pública
  - Reglamento de zonificación de los usos de suelo, Habilitación Urbana y sistema Vial

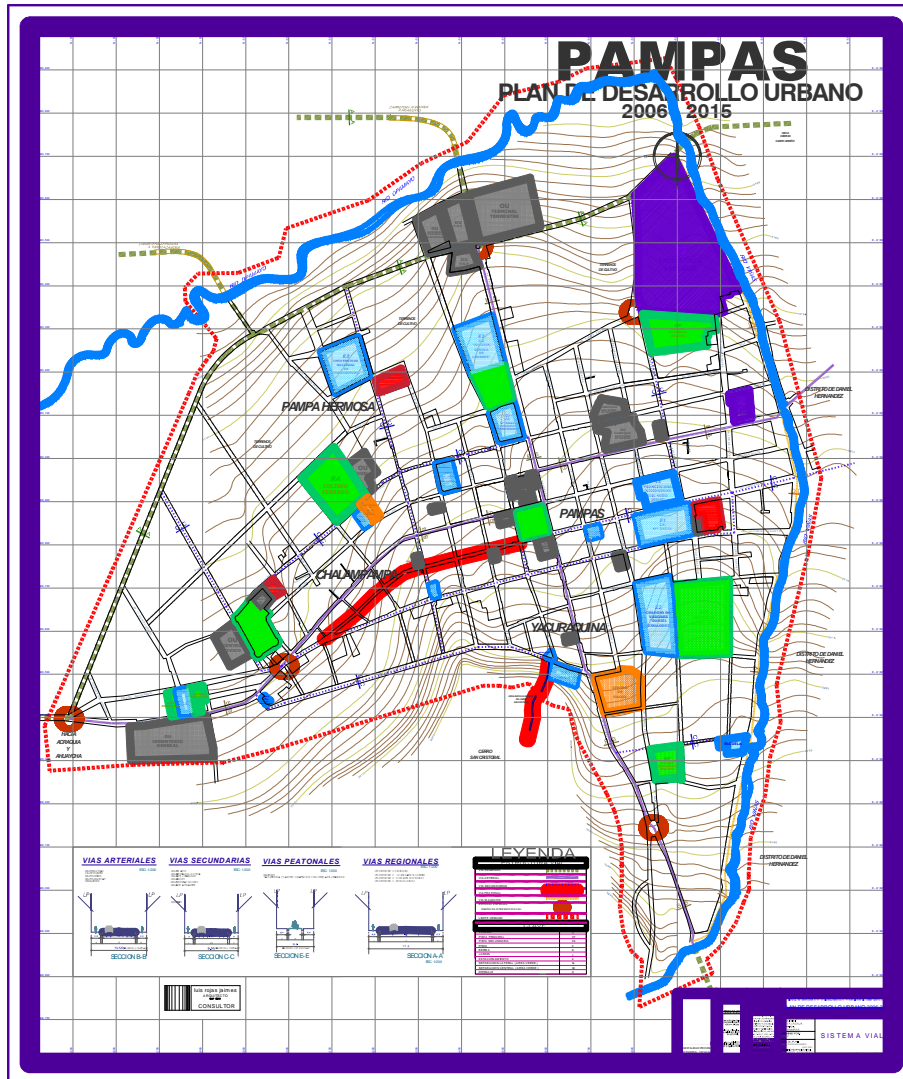

## Se Cuenta con los planos de:

- Planos Diagnósticos.
  - Plano de Ubicación y Localización.
  - Plano de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
  - Plano Básico.
  - Diagnostico Urbano.
  - Vulnerabilidad Física y Contingencias.
  - Plano de Diagnostico Servicios.
- 
- Plano Propuesta Urbana
  - Plano por Sectorización por Barrios
  - Plano de Zonificación de los Usos del Suelo.
  - Equipamiento Urbano y Propuesta.
  - Sistema Vial.
  - Identificación de los Proyectos de Inversión Pública

# ATENCIÓN AL USUARIO

TRAMITE	CANT	ESTADO	OBSERV.
<b>CERTIFICACIONES Y OTROS</b>			
Certificado de Zonificación y Vías	04	Culminado	
Certificado de Numeración de Finca	18	Culminado	
Certificado Domiciliario	74	Culminado	
Certificado de Parámetros Urbanísticos	19	Culminado	
Certificado Negativo de catastro	08	Culminado	
Visación de Plano	07	Culminado	
Ocupación de Vías	29	Culminado	
<b>LICENCIAS</b>			
Licencia de Edificación	16	Culminado	
Licencia de Edificación	16	En Tramite	Observados
Licencia de Edificación de cercado	11	Culminado	
<b>CONVENIOS</b>			
Convenio de Alineamiento Vial	05	Culminado	
Convenio de Alineamiento Vial	06	En tramite	
